



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

CEP 38490-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

GABINETE DO PREFEITO

Praça Urias José da Silva, n.º 42

(34)3245-1749- e-mail: pmindianopolis@com4.com.br



Ofício n.º 382 /2005-GP/PMI

Indianópolis-MG, 14 setembro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Clodoaldo José Borges
Presidente da Câmara Municipal
Indianópolis-MG

Assunto: Responde o Ofício n.º 324/2005 – CM/GP.

Senhor Presidente,

Em resposta à solicitação de Vossa Excelência, feita pelo Ofício n.º 324/2005-CM/GP, atendendo o pedido da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, encaminhamos em anexo, cópias dos Relatórios dos serviços executados pela empresa TENCO ENGENHARIA LTDA.

Atenciosamente,


RENES JOSÉ BORGES PEREIRA
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL INDIANOPOLIS - MG

Protocolo Nº 348/2005

Biba 14/09/2005

Responsável Protocolo

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

Projeto: NOVO SOMMA

Licitação nº : 004/2005

Empresa: TENCO ENGENHARIA LTDA

Contrato com a Empresa Nº:

Engenheiro Responsável - Município: JAUDET ZEKI RASSI JUNIOR

Contrato BDMG Nº: 123.947

Medicao Nº : 02

Período: 01/07/05 a 31/07/05

Data: 01/08/05

Folha: 01/02

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$	QUANTIDADE PREVISTOS TOTAL	QUANTIDADE EXECUTADA NESTA MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA ACUMULADA	VALOR PREVISTOS TOTAL (R\$)	VALOR EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO ACUMULADO (R\$)
1	DRENAGEM PLUVIAL								
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	Mobilização e desmobilização	vb	2.000,00	1,00			-	-	-
1.2	Placas de obras	m²	105,00	8,00	1,00	1,00	2.000,00	-	2.000,00
1.3	Locação topográfica	m	1,75	1.106,40	8,00	8,00	840,00	-	840,00
2	SERVIÇOS EM TERRA								
2.1	Escavação mecânica de valas prof. Até 1,50m	m³	3,60	2.494,24	2.494,24	2.494,24	8.979,26	-	8.979,26
2.2	Escavação mecânica de valas prof. de 1,50 a 4,0m	m³	4,71	1.543,68	1.543,68	1.543,68	7.270,73	7.270,73	7.270,73
2.3	Acerto de fundo de valas	m²	1,40	1.320,28	1.320,28	1.320,28	1.848,39	1.848,39	1.848,39
2.4	Aterro compactado de valas c/ controle visual	m³	6,40	3.793,45	3.793,45	3.793,45	24.278,08	24.278,08	24.278,08
2.5	Escoramento de valas tipo pontaleamento	m²	6,40	3.731,00	3.731,00	3.731,00	23.878,40	23.878,40	23.878,40
2.6	Berço de concreto Fck 13,5 Mpa	m³	245,00	96,80	96,80	96,80	23.716,00	23.716,00	23.716,00
2.7	Demolição asfáltica inclusive corte com serra clipper e retirada de entulho	m²	3,00	295,00	295,00	295,00	885,00	885,00	885,00
2.8	Recomposição asfáltica CBUQ inclusive base de cascalho, imprimeção e pintura de ligação	m²	22,00	295,00	295,00	295,00	6.490,00	-	-
3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MANILHA DE CONCRETO								
3.1	Diâmetro de 600 mm	m	63,00	744,60	154,60	154,60	9.739,80	9.739,80	46.909,80
3.2	Diâmetro de 400 mm	m	42,00	271,00	71,00	271,00	11.382,00	2.982,00	11.382,00
4	EXECUÇÃO DE POÇOS DE VISITA COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO								
4.1	Execução de caixa de passagem	UN	975,00	11,00	9,00	9,00	10.725,00	8.775,00	8.775,00
5	EXECUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM								
5.1	Execução de bocas de lobo dupla	UN	590,00	8,00	11,00	11,00	4.720,00	6.490,00	6.490,00
6	EXECUÇÃO DE BOCAS DE LOBO DUPLA								
6.1	Execução de dissipador P/ rede de 600 mm	un	925,00	35,00	22,00	22,00	32.375,00	20.350,00	20.350,00
7	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR P/ REDE DE 600 mm								
7.1	Pavimentação asfáltica	un	650,00	1,00	1,00	1,00	650,00	-	-
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	Mobilização e desmobilização e canteiro	vb	6.200,00	1,00			6.200,00	-	-
1.2	Placas de obras	m²	105,00	8,00			840,00	-	-
1.3	Locação topográfica	m²	0,36	14.372,08			5.173,95	-	-



[Handwritten signature]

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Ciente: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

Projeto: NOVO SOMMA

Licitação nº : 004/2005

Empresa: TENCO ENGENHARIA LTDA

Contrato com a Empresa nº:

Engenheiro Responsável - Município: JAUDET ZEKI RASSI JUNIOR

Contrato BDMG Nº: 123.947

Medicao Nº : 02
Período: 01/07/05 a 31/08/05
Data: 01/08/05
Folha: 02/02

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$	QUANTIDADE PREVISTOS TOTAL	QUANTIDADE EXECUTADA NESTA MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA ACUMULADA	VALOR PREVISTOS TOTAL (R\$)	VALOR EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO ACUMULADO (R\$)
2	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ								
2.1	Abertura de caixa ,inclusive boca fora de material escavado c/ DMT = 5 Km	m3	8,80	5.791,94					
2.2	Regularização e compactação de sub-leito	m²	1,40	14.372,08			50.969,07		
2.3	Escavação, carga e transporte de material de base DMT= 10 Km	m3	8,80	2.242,05			20.120,91		
2.4	Base de cascalho estabilizado granulométrica- mente sem mistura e= 12 cm	m3	2,45	14.372,08			19.730,04		
2.5	Imprimação com cm-30	m²	3,45	11.988,80			35.211,60		
2.6	Pintura de ligação RR-2C	m²	1,35	11.988,80			41.361,36		
2.7	Transporte de C.B.U.Q DMT=60 KM	t/Km	0,32	35.637,12			16.184,88		
2.8	Aplicação de C.B.U.Q ESP= 2 CM	m²	8,25	11.988,80			11.403,88		
3	MEIO FIO COM SARJETA								
3.1	Execução de meio fio com sarjeta em concreto extrusado consumo de 52l/m3	m	16,75	3.852,00			98.907,60		
Total Geral							579.508,16	138.192,67	189.538,87

Data da medição: 01/08/05

(Assinatura)

(Visto) Engenheiro da Empresa:


(visto) Engenheiro Fiscal do Município:

OBSERVAÇÕES:




Câmara Municipal
L. N.º 38
Visto

Detalhe do lastro de concreto Rua Getúlio Vargas com Rua Francisco Lavrinho

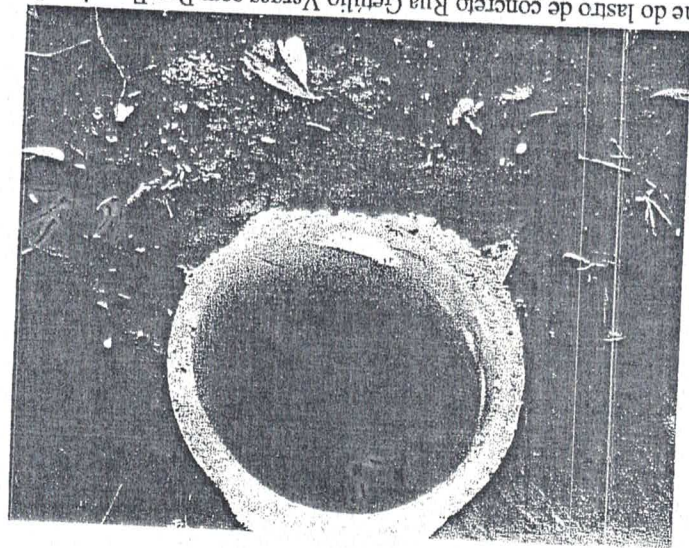

Início do assentamento de tubos na Rua Getúlio Vargas com Rua Francisco Lavrinho

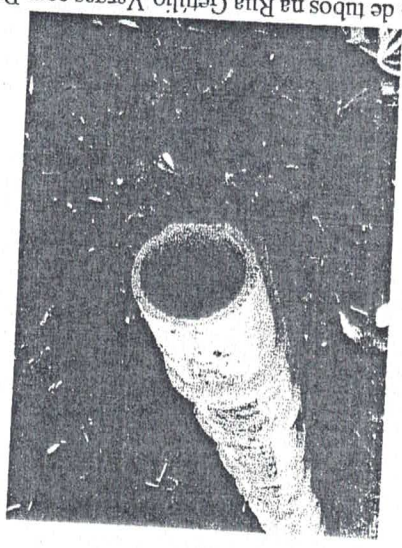


MEDIÇÃO: 02
DATA: 01/08/05
OBRA: Execução de Redes e Emissário de Esgoto, Drenagem de Águas Pluviais e Pavimentação Asfáltica em diversas ruas da cidade de Indianópolis-MG.


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Câmara Municipal
FL. Nº 39
Belo
Visto


Execução de astro de concreto na Rua Irineu Alves Rabelo

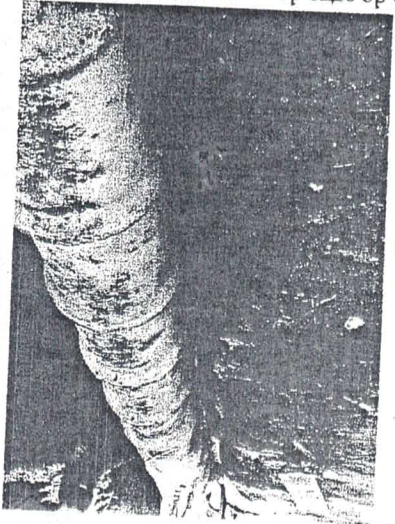

Assentamento de tubo de concreto conforme alinhamento e cotas de projeto na Rua João Butica

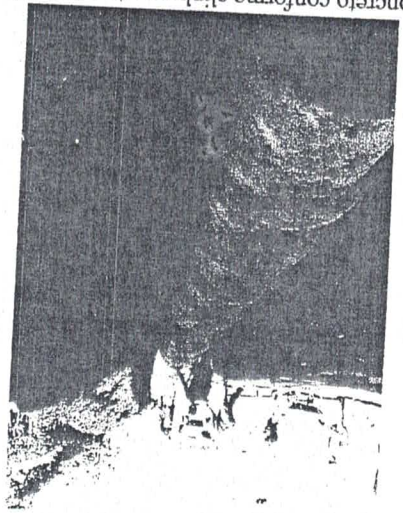

Camara Municipal
FL. Nº 40
[Signature]
Visto

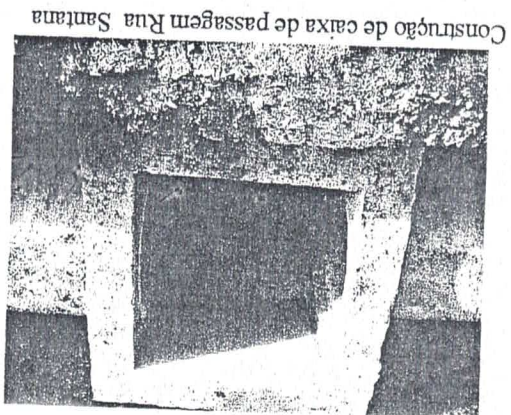


Construção de caixa de passagem Rua Santana

Processo de aterro com utilização de compactador do tipo Sapo esquina da Rua Santana com Juvenal Pereira dos Santos




Conclusão de tacho da rede de água pluvial

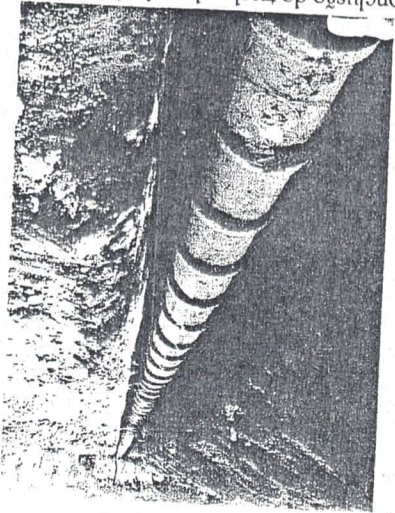





Conclusão de rede de água pluvial Rua Santana

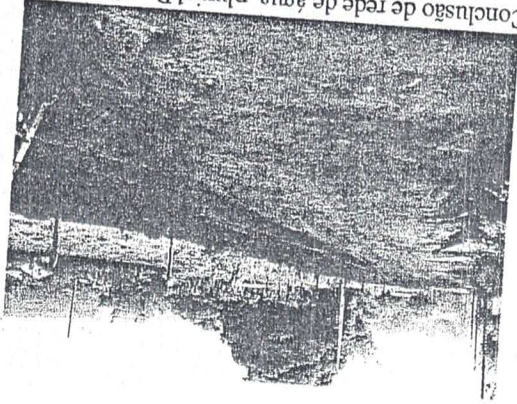

Construção de boca de lobo Rua Santana

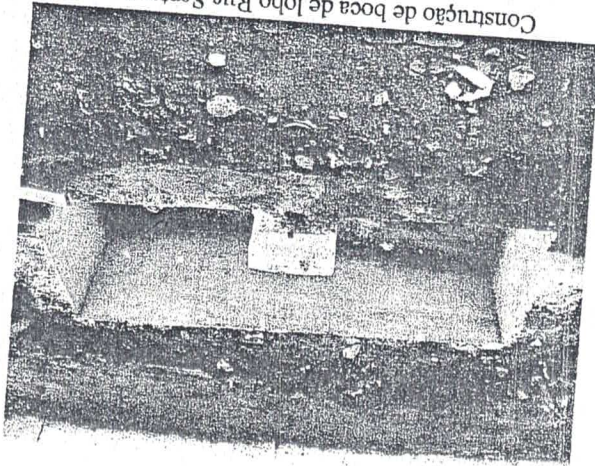


Construção de Poço de Visita (PV)

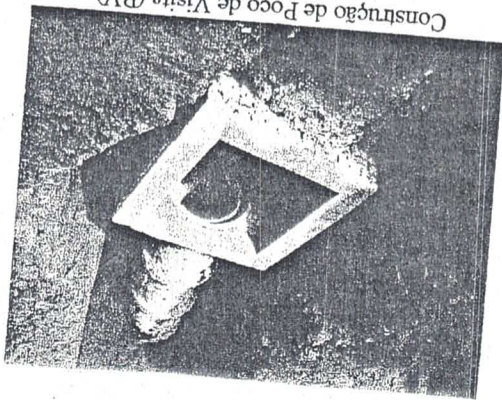





Conclusão de PV

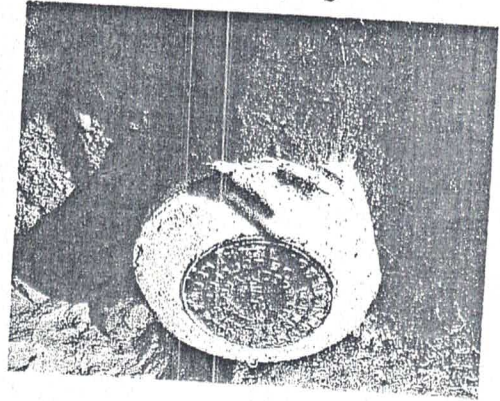


Conclusão de trecho do emissário

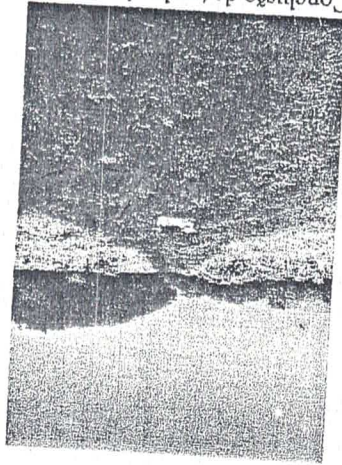

Início da construção de Poço de Visita(PV) no emissário de esgoto

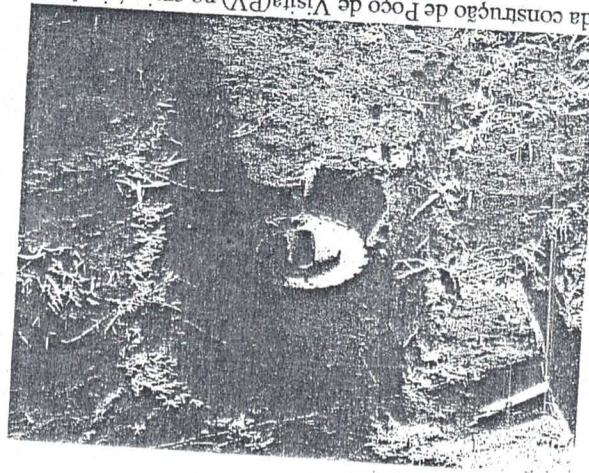

Construção de trecho do emissário de esgoto Fazenda Lorena

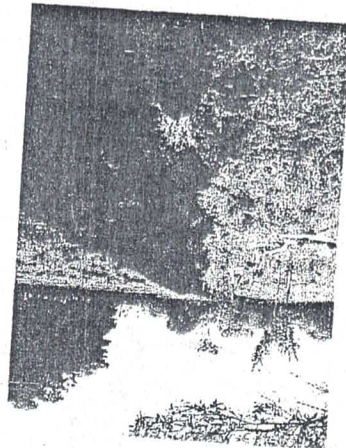

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Ciente: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

Projeto: NOVO SOMMA

Licitação nº : 004/2005

Empresa: TENCO ENGENHARIA LTDA

Contrato com a Empresa Nº:

Engenheiro Responsável - Município: JAUDET ZEKI RASSI JUNIOR

Contrato BDMG Nº: 123.799

Medição Nº : 02

Período: 01/07/05 a 31/07/05

Data: 01/08/05

Folha: 01/01

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$	QUANTIDADE PREVISTOS TOTAL	QUANTIDADE EXECUTADA NESTA MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA ACUMULADA	VALOR PREVISTOS TOTAL (R\$)	VALOR EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO ACUMULADO (R\$)
EMISSÁRIO E REDES DE ESGOTO									
1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	Mobilização								
1.2	Canteiro de Obras	vb	2.500,00	1,00		1,00	2.500,00		2.500,00
1.3	Levantamento Planialtimétrico	vb	5.000,00	1,00		1,00	5.000,00		5.000,00
1.4	Limpeza de Faixa	m	1,75	5.295,10		5.295,10	9.266,43		9.266,43
1.5	Placa de Obras	m²	1,00	15.352,80		15.352,80	15.352,80		15.352,80
2 SERVIÇOS EM TERRA									
2.1	Escav. Mec. Solo de 1ª Categoria, até 1,50m	m³	3,60	9.208,80				5.852,80	5.852,80
2.2	Escav. Mec. Solo de 1ª Categoria, de 1,50 a 4,0m	m³	4,71	1.947,06		8.208,00	33.151,68		33.151,68
2.3	Regularização e Apilamento de Rocha a frio	m³	122,00	312,00		1.644,00	9.170,65	11.080,80	29.548,80
2.4	Escoramento Tipo Pontaleamento	m²	1,40	5.385,10		312,00	38.064,00	2.637,60	7.743,24
2.5	Escavação Cart e Transp. de Mat. de 1º Cat. para Reaterro DMT= 3 KM	m³	6,40	10.946,02		1.835,00	7.539,14	15.250,00	38.064,00
2.6	Reaterro Compactado de vala c/ controle visual	m³	7,00	312,00		2.850,00	70.054,53	2.569,00	6.699,00
2.7	EXECUÇÃO DE REDE EM MANILHA DE BARRO	m²	6,70	11.467,86		138,20	2.184,00	18.240,00	59.206,40
3.1	Diametro de 150 mm							967,40	2.184,00
3.2	Diametro de 200 mm							76.834,66	66.001,70
4 EXECUÇÃO DE POÇOS DE VISITA									
4.1	Execução de Poços de Visita em Manilha de Concreto DN= 800 mm c/ Tampão de Ferro Fundido	m	15,25	4.915,10		665,00	74.955,28		74.955,28
		m	24,00	380,00		380,00	9.120,00	10.141,25	55.128,75
5 EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES DE ESGOTO									
5.1	Execução de ligações domiciliares de esgoto	un	1.052,00	56,00		16,00	58.912,00	16.832,00	43.132,00
		un	215,00	6,00		6,00	1.290,00		1.290,00
Total Geral							414.025,15	117.695,85	350.367,12

(Assinatura)

(Visto) Engenheiro da Empresa.

(Visto) Engenheiro fiscal do Município.

DATA DA MEDIÇÃO: 01/08/05

OBSERVAÇÕES:





CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS



Indianópolis, 14 de setembro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Leonídio Bouças
Deputado Estadual
Belo Horizonte – MG

Senhor Deputado,

Informamos a Vossa Excelência que o Município de Indianópolis firmou, em 2004, contratos com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), programa Novo SOMMA, para execução dos seguintes projetos:

1. Infra-estrutura urbana destinada à pavimentação e drenagem pluvial de vias com a construção de galerias pluviais e meios-fios em bairros residenciais da cidade. Valor do empréstimo: R\$ 402.500,00;
2. Implantação de dois interceptores de esgoto doméstico ligando a Estação de Tratamento de Esgoto à rede de esgoto da sede da cidade do Município. Valor do empréstimo: R\$ 320.000,00;
3. Ações na área de tecnologia de informação e equipamentos de informática, capacitação de recursos humanos e serviços de modernização administrativa. Valor do empréstimo: R\$ 127.000,00.

A realização de parte desses projetos foi iniciada e esta Câmara não possui informações mais detalhadas sobre o assunto.

Entramos em contato com o BDMG e não recebemos todos os dados necessários sobre os recursos liberados até este momento.

Por essa razão, solicitamos a Vossa Excelência o obséquio de contatar a direção do referido banco a fim de obter as informações a seguir:

- a) Montante dos recursos financeiros já liberados pelo BDMG ao Município, até esta data;



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS



b) cópia das medições dos serviços executados, apresentada ao banco pela Prefeitura, para efeito de liberação dos recursos.

Atenciosamente,

Clodoaldo José Borges
CLODOALDO JOSE BORGES
Presidente
